
6. Réseau PERT & Analyse Mathématique de l'Ordonnancement

Le graphe PERT ci-dessous modélise le réseau de dépendances du projet VisionX. Il met en évidence la durée minimale théorique (20 jours ouvrés).

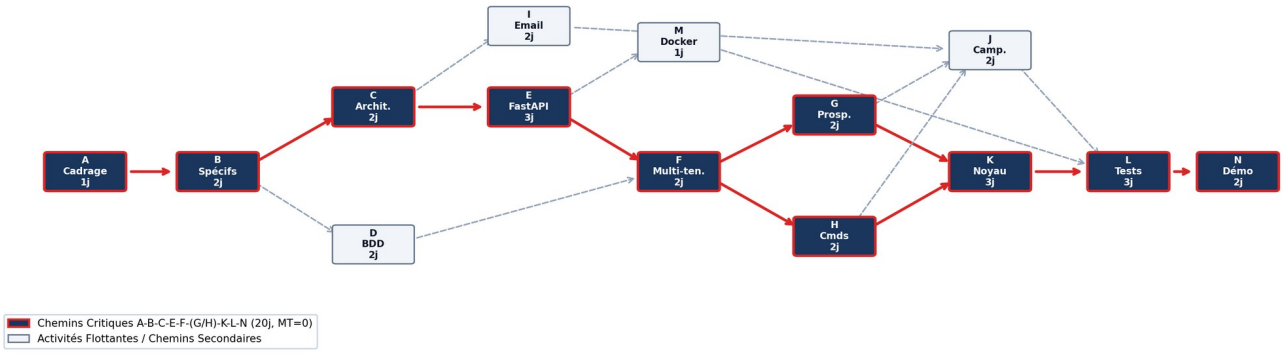

ID	Dur.	Pred.	DTO	FTO	DTA	FTA	Marges (MT / ML)	Statut
A	**1 j**	**—**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
B	**2 j**	**A**	**J2**	**J3**	**J2**	**J3**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
C	**2 j**	**B**	**J4**	**J5**	**J4**	**J5**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
D	2 j	B	J4	J5	J7	J8	MT = 3 | ML = 3	Flottante
E	**3 j**	**C**	**J6**	**J8**	**J6**	**J8**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
F	**2 j**	**D, E**	**J9**	**J10**	**J9**	**J10**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
G	**2 j**	**F**	**J11**	**J12**	**J11**	**J12**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
H	**2 j**	**F**	**J11**	**J12**	**J11**	**J12**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
I	2 j	C	J6	J7	J11	J12	MT = 5 | ML = 5	Flottante
J	2 j	G, H, I	J13	J14	J14	J15	MT = 1 | ML = 1	Flottante
K	**3 j**	**G, H**	**J13**	**J15**	**J13**	**J15**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
M	1 j	E	J9	J9	J15	J15	MT = 6 | ML = 6	Flottante
L	**3 j**	**J, K, M**	**J16**	**J18**	**J16**	**J18**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**
N	**2 j**	**L**	**J19**	**J20**	**J19**	**J20**	**MT = 0 | ML = 0**	**CRITIQUE**

Chemins Critiques (MT=0) : A→B→C→E→F→G→K→L→N (20j) et A→B→C→E→F→H→K→L→N (20j). Tout retard sur ces 8 activités reporte l'échéance finale.
