
8. Diagramme de Gantt Prévisionnel (Calendrier sur 20 Jours Ouvrés)

Le diagramme de Gantt convertit l'ordonnancement PERT en un calendrier opérationnel. Les barres foncées indiquent les tâches critiques.

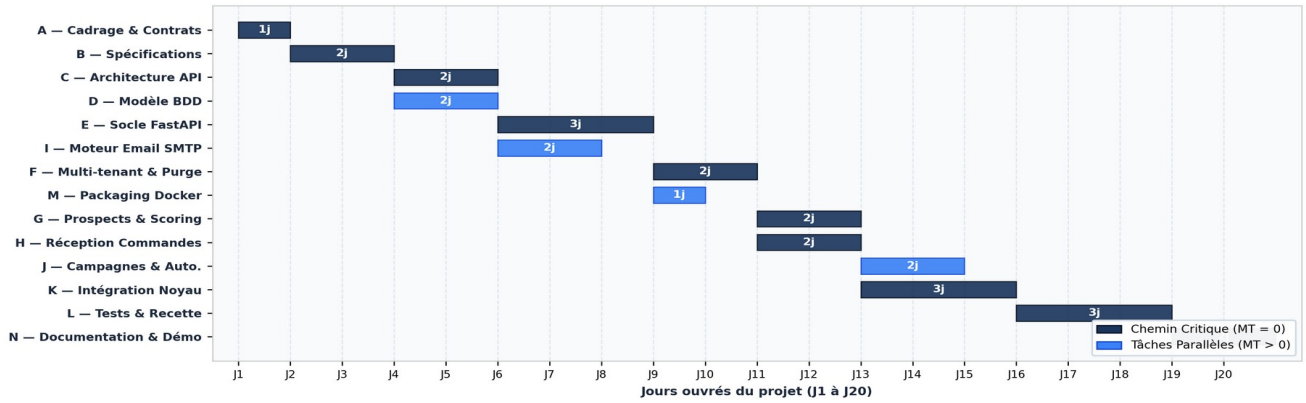

ID	Activité	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Responsables mobilisés
A	Cadrage & validation des contrats	J1 (08h00)	J1 (17h00)	M. Anes Bouharizi
B	Spécifications fonctionnelles & techniques	J2 (08h00)	J3 (17h00)	M. Anes, S. Iyed, Z. Akram
C	Conception de l'architecture logicielle	J4 (08h00)	J5 (17h00)	M. Anes, S. Iyed
D	Modélisation de la base de données	J4 (08h00)	J5 (17h00)	F. Baha
E	Développement du socle FastAPI	J6 (08h00)	J8 (17h00)	S. Iyed
I	Micro-moteur email Jinja2 / SMTP	J6 (08h00)	J7 (17h00)	B. Anis, B. Adem
F	Isolation multi-tenant & persistance	J9 (08h00)	J10 (17h00)	F. Baha, B. Adem
M	Packaging Docker & configuration	J9 (08h00)	J9 (17h00)	B. Adem
G	Gestion prospects & Lead Scoring	J11 (08h00)	J12 (17h00)	B. Anis, F. Baha
H	Réception & traitement des commandes	J11 (08h00)	J12 (17h00)	Z. Akram, S. Iyed
J	Automatisations & campagnes marketing	J13 (08h00)	J14 (17h00)	B. Anis
K	Intégration & échanges avec le noyau	J13 (08h00)	J15 (17h00)	S. Iyed, Z. Akram
L	Tests de conformité, intégration & sécurité	J16 (08h00)	J18 (17h00)	Toute l'équipe VisionX
N	Documentation finale & préparation démo	J19 (08h00)	J20 (17h00)	M. Anes, toute l'équipe

Stratégie de lissage : Parallélisation systématique (D//C, I//E, G//H). Équilibrage optimal de la charge sans heures supplémentaires.
